

その他資料1

【令和7年5月】(仮称)認定こども園壱分こども園整備経過報告と今後の予定

■経過報告


令和7年5月 壱分幼稚園園舎解体工事
5月9日(金) 落札候補者決定

壱分幼稚園保育参観
5月12日(月) 年中(14時降園)
5月15日(木) 年少(11時半降園)
5月20日(火) 年長(14時降園)

※保育参観の実施にあたり、壱分幼稚園保護者あてになばた幼稚園までの来園方法についてイロドリにてアンケートを実施(回答数48人/対象者数56名)
→徒歩、バス、自転車の回答が多かったため、マイクロバス輸送を実施

■今後の予定

令和7年5月下旬 壱分幼稚園園舎解体工事業者選定後初回打合せ
5月末から6月初旬 工事説明会
6月中旬 解体工事に伴う家屋調査を実施
6月下旬以降 解体工事着工

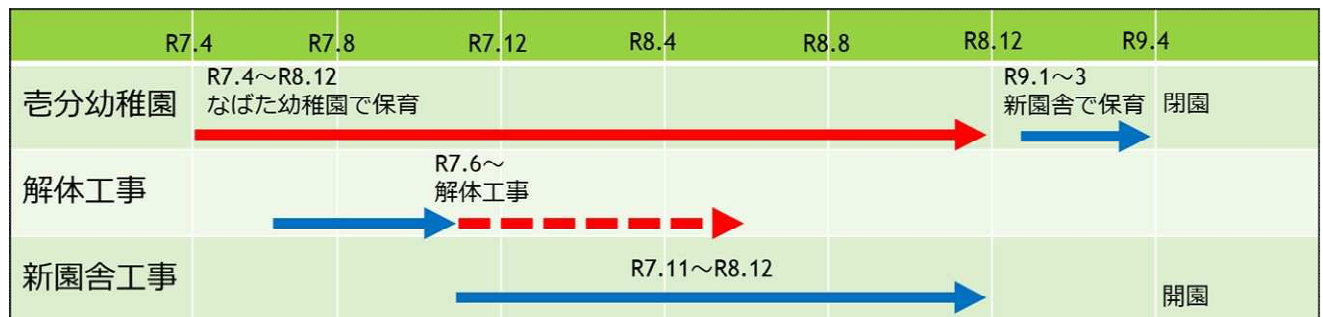

- ・解体工事は第1期、第2期と2期に分けて実施
- ・第1期解体工事終了後、新園舎の建築を開始
令和8年12月の園舎完成を目指して着工
(施工は公私連携法人候補者 社会福祉法人どんぐり)
