【令和 7 年 8 月】（仮称）認定こども園壱分こども園整備経過報告と今後の予定

■報告

前回会議でご質問のあったアスベスト撤去について､第 1 期工期分のアスベスト除去が終わりましたので報告します。

7 月 17 日～保育棟アスベスト除去、7 月 22 日～管理棟アスベスト除去

いずれも 7 月 25 日に完了

○作業の様子

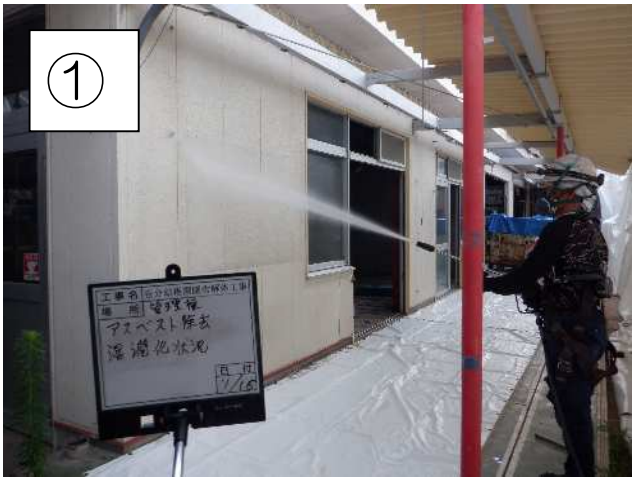

解体部分について湿潤を行っています。
湿潤することで、風にのって拡散することを防ぎます。
また、下にシートを引き、作業後、破片やチリ等を掃除またはシートごと撤去することで残らないようにしないようにしています。

外壁の解体を手作業で行っています。また、作業員はマスク等の対策を行った上で、除去を実施しています。
なお、アスベストは天井ボードと外壁ボードの一部に含まれていました。

① 湿潤作業
② 手バラシにて解体
③ アスベスト除去後

○外観

解体工事開始直後の様子です。
大きくは変わりませんが、建物内部や周辺など、解体できるところから少しずつ進めています。
特に足場を組む際に障害となる部分については先に解体する必要があるため、渡り廊下の屋根などから解体を進めています。

第１期工事の範囲である、管理棟及び保育棟１に足場を組んだ状況です。防音シートを張り、騒音を防止するほか、アスベスト作業の際に飛散することも防いでいます。

第１期工事の内装、外装解体が終わり、足場を外した状態です。
外壁もなくなり、鉄骨がむき出しになっています。
解体工事は順調に進んでいます。

④ 工事開始直後
⑤ 足場囲い
⑥ 現況（アスベスト撤去後）

■今後のスケジュール

・**解体工事**

今後 10 月までに第 1 期工事を完了

・**新設工事**

9 月下旬～10 月初旬に施工業者決定予定（どんぐり）
10 月中旬～下旬　新築工事説明会（どんぐり、市）
